



Objet : Restrictions d'utilisation de l'AD Marseille Provence LFML cause extension de l'aérogare MP2, renforcement ponctuel et réfection d'une partie de l'aire de trafic et de TWY (G1, L1 et L2) et reconfiguration de postes de stationnement

En vigueur : Du 09 août 2018 au 24 avril 2019

Ce SUP AIP annule et remplace le SUP AIP 044/18 ;
sa date de mise en vigueur sera confirmée par NOTAM.

Préambule :

L'objet du présent SUP AIP est de décrire :

- l'évolution des travaux d'extension de l'aérogare MP2, de modification de la configuration des postes de stationnement au niveau des parkings 46C à 48G ainsi que la réfection d'une partie de l'aire de trafic et de ses accès avions jusqu'à sa livraison définitive ;
- l'évolution des travaux de modification de la configuration des postes de stationnement au niveau des parkings 60 à 69 ainsi qu'une partie située devant le Centre d'Aviation Générale (CAG) et de ses accès avions jusqu'à sa livraison définitive.

Les travaux se dérouleront en différentes phases activées par NOTAM et selon les plans détaillés en annexes.

Annexe 3 - Phase 3 : Travaux sur postes 46 à 49 et 67 à 69

Annexe 4 - Phase 4 : Travaux sur postes 48E et 64 à 69 et TWY L2 et G1

Annexe 5 - Phase 5 : Travaux sur postes 46 à 49 et 64 à 69 et TWY L2 et G1

Annexe 6 - Phase 6 : Travaux sur poste 48E

Annexe 7 - Phase 7 : Travaux sur postes 46 à 49

Annexe 8 - Phase 8 : Travaux sur postes 47A et 47C

Annexe 9 - Phase 9 : Travaux sur postes 48A et 48C

Annexe 10 - Phase 10 : Configuration définitive. Cette information sera reprise dans l'AIP au cycle 05/19 en vigueur le 25 avril 2019.

Les coordonnées INS des postes de stationnement seront publiées par NOTAM.

Dispositions générales :

Les travaux de jour sont réalisés entre 0600 et 1800 UTC (été : - 1 HR).

Un balisage de la zone neutralisée est mis en place selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Régulation :

Des mesures de régulation de trafic pourront être mises en place et des attentes seront possibles à l'arrivée et au départ.

Procédure Catégorie III :

Pas de conséquences.

PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE

Annexe / Appendix 3 : Phase 3 - Travaux sur postes 46 à 49 et 67 à 69 / Works on stands 46 to 49 and 67 to 69

Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :


- Postes 3Z et 4Z / Stands 3Z and 4Z
- Postes 46C, 46E, 47E, 49C et 49E / Stands 46C, 46E, 47E, 49C and 49E
- Postes 5Z et 6Z / Stands 5Z and 6Z
- Postes 66W, 66P, 67N, 68N, 69N / Stands 66W, 66P, 67N, 68N, 69N
- Poste 64 / Stand 64
- Postes hélicoptères HL1 et HL2 / Helicopter stands HL1 and HL2

Restrictions / Restrictions :

- Poste 66E limité au Beechcraft 200 pour MEDEVAC / Stand 66E restricted to hospital flight Beechcraft 200
- Postes 63A à 63E départ en repoussage uniquement / Stands 63A to 63E, departure with push back only
- Poste 65 départ au repoussage uniquement / Stand 65 departure with push back only
- Postes 70 pas de sortie par L2 / Stands 70 no exit via L2

Nouveaux postes de stationnement mis à disposition / New parking stands available :

- Mise à disposition des nouveaux postes 48C et 48E (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 48C and 48E available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 60N, 61N et 62N (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 60N, 61N and 62N available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 63A à 63E (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 63A to 63E available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 available (new INS coordinates, please see NOTAM)

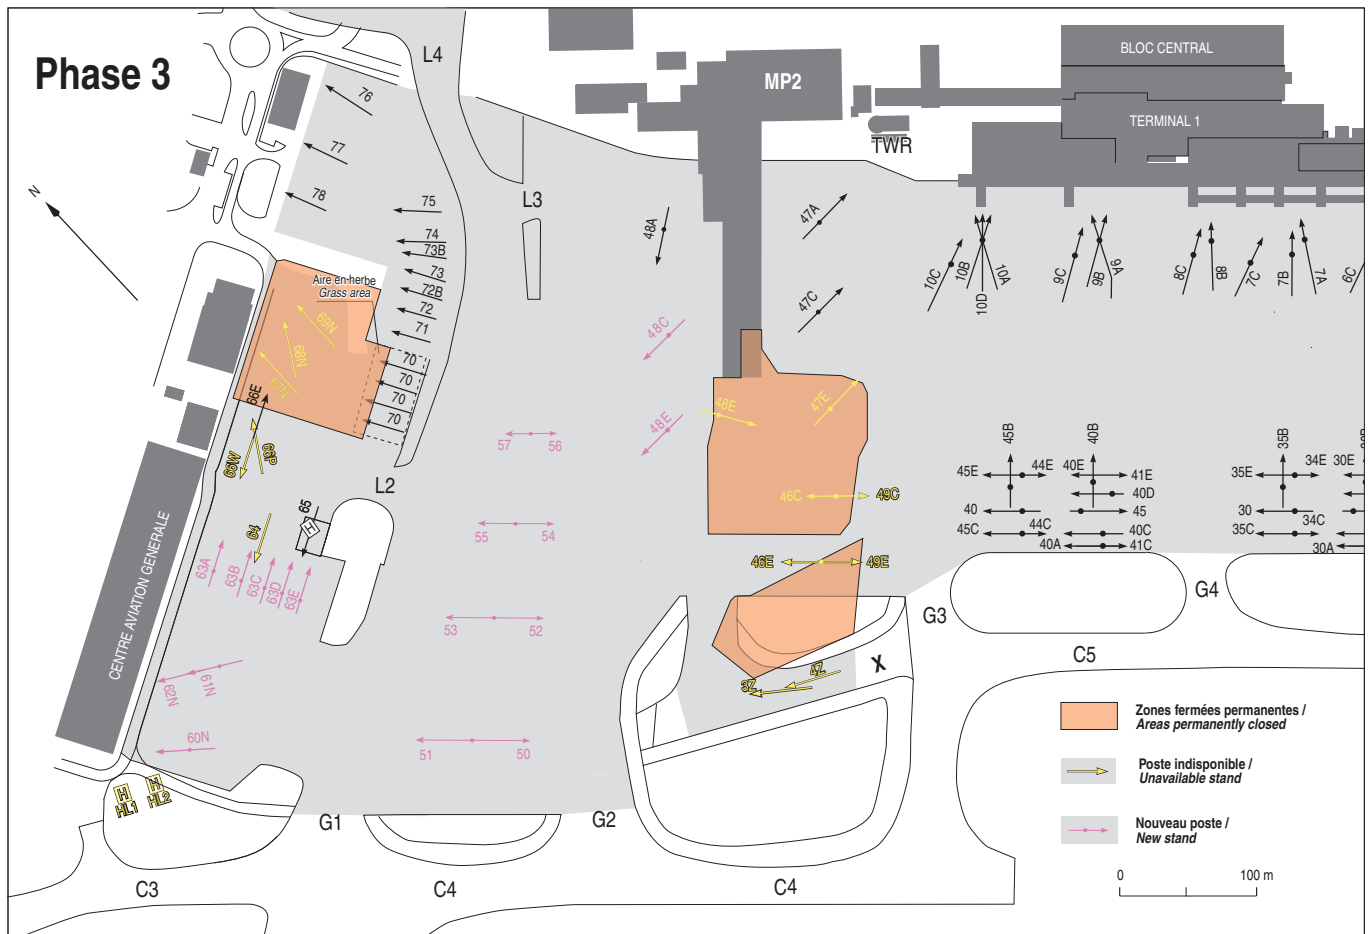

Annexe / Appendix 4 : Phase 4 - Travaux sur poste 48E et 64 à 69 et voies L2 et G1 / Works on stand 48E and 64 to 69 and TWY L2 and G1

Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :


- Poste 3Z / Stand 3Z
- Postes 48E et 49C / Stands 48E and 49C
- Postes 5Z et 6Z / Stands 5Z and 6Z
- Voie L2 / TWY L2
- Postes / Stands 64, 65, 66W, 66E, 66P, 67N, 68N, 69N
- Poste hélicoptère sur 65 / Helicopter stand on stand 65
- Postes 70 / Stands 70
- Postes hélicoptères HL1 et HL2 / Helicopter stands HL1 and HL2
- Ponctuellement, des travaux de balisage et de marquage seront réalisés de jour sur la voie G1. Ces fermetures ponctuelles seront annoncées par NOTAM / Occasionally works on ground lighting and marking will be carried out during the day on TWY G1. These occasional closures will be announced by NOTAM

Restrictions permanentes / Permanent restrictions :

- Poste 46C départ au repoussage uniquement / Stand 46C departure with push back only
- Poste 63A à 63E avec départ au repoussage uniquement / Stands 63A to 63E, departure with push back only

Nouveaux postes de stationnement mis à disposition / New parking stands available :

- Mise à disposition du nouveau poste 48C (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stand 48C available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 60N, 61N et 62N (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 60N, 61N and 62N available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 63A à 63E (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 63A to 63E available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 available (new INS coordinates, please see NOTAM)

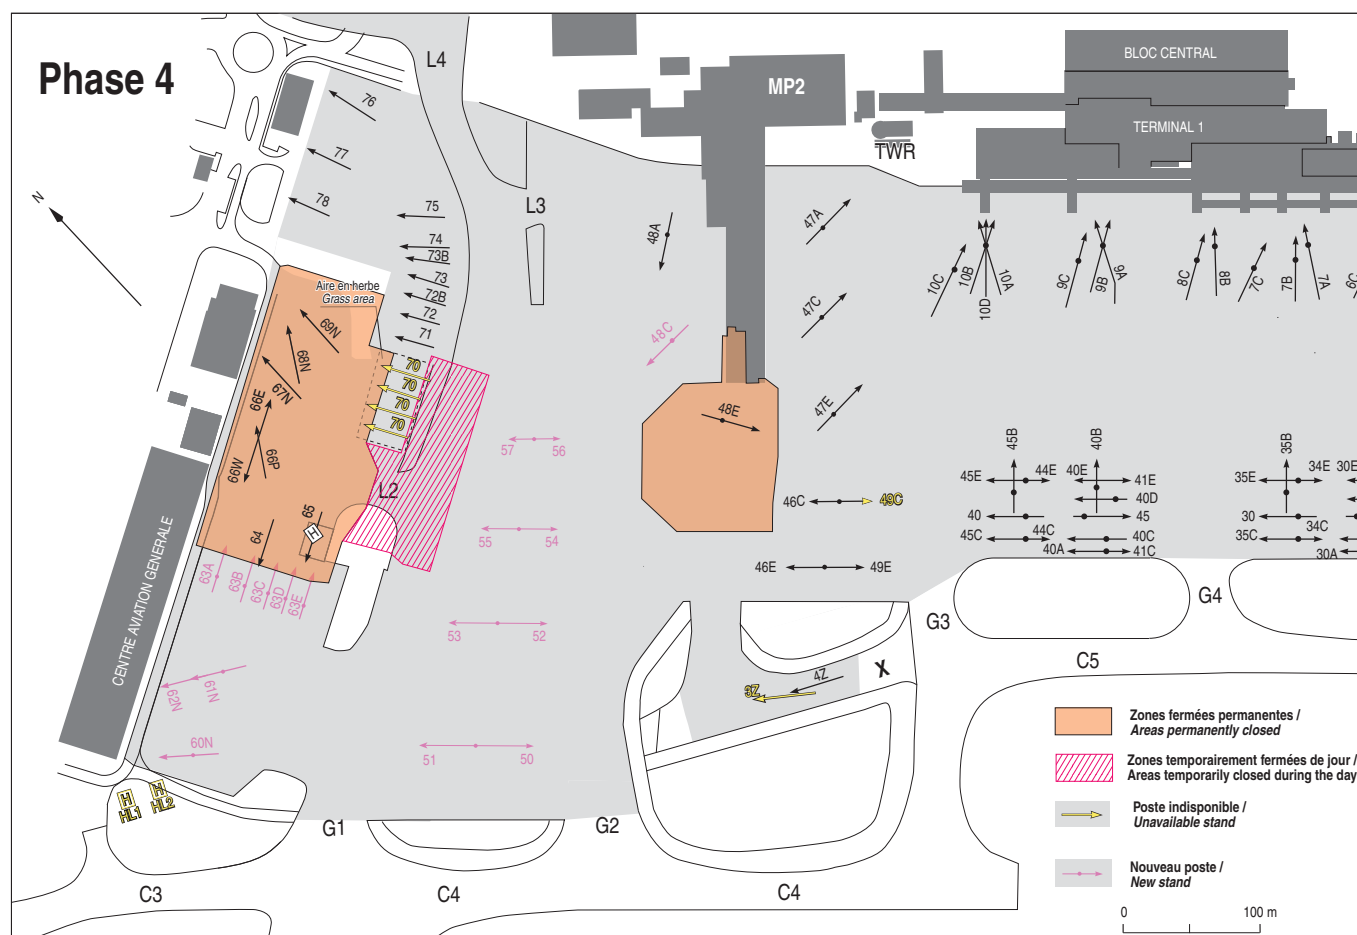

Annexe / Appendix 5 : Phase 5 - Travaux sur postes 46 à 49 et 64 à 69 et voies L2 et G1 / Works on stands 46 to 49 and 64 to 69 and TWY L2 and G1

Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :


- Postes 3Z et 4Z / Stands 3Z and 4Z
- Postes 46C, 46E, 47E, 49C et 49E / Stands 46C, 46E, 47E, 49C and 49E
- Postes 5Z et 6Z / Stands 5Z and 6Z
- Voie L2 / TWY L2
- Postes / Stands 64, 65, 66W, 66E, 66P, 67N, 68N, 69N
- Poste hélicoptère sur 65 / Helicopter stand on stand 65
- Postes 70 / Stands 70
- Postes hélicoptères HL1 et HL2 / Helicopter stands HL1 and HL2
- Ponctuellement, des travaux de balisage et de marquage seront réalisés de jour sur la voie G1. Ces fermetures ponctuelles seront annoncées par NOTAM / Occasionally works on ground lighting and marking will be carried out during the day on TWY G1. These occasional closures will be announced by NOTAM

Restrictions permanentes / Permanent restrictions :

- Postes 63A à 63E avec départ au repoussage uniquement / Stands 63A to 63E, departure with push back only

Nouveaux postes de stationnement mis à disposition / New parking stands available :

- Mise à disposition des nouveaux postes 48C et 48E (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 48C and 48E available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 60N, 61N et 62N (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 60N, 61N and 62N available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 63A à 63E (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 63A to 63E available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 available (new INS coordinates, please see NOTAM)

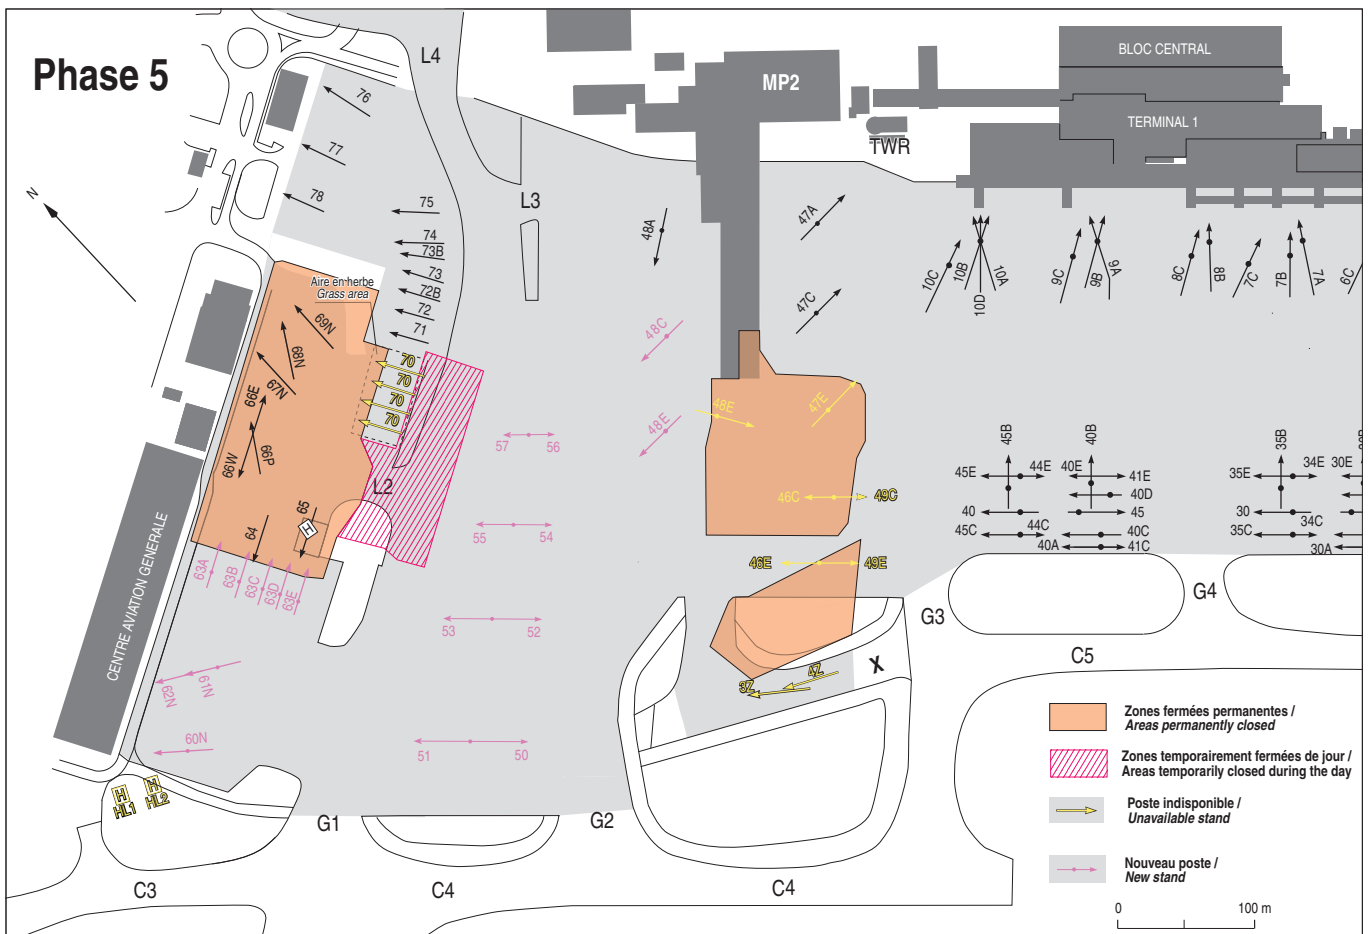

Annexe / Appendix 6 : Phase 6 - Travaux sur poste 48E / Works on stand 48E

Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :


- Poste 3Z / Stand 3Z
- Postes 48E et 49C / Stands 48E and 49C

Restrictions / Restrictions :

- Poste 46C départ au repoussage uniquement / Stand 46C departure with push back only

Nouveaux postes de stationnement mis à disposition / New parking stands available

- Mise à disposition du nouveau poste 48C (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stand 48C available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 60N, 61N et 62N (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 60N, 61N and 62N available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 64, 64B, 65, 66E, 67N, 68N et 69N (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 64, 64B, 65, 66E, 67N, 68N and 69N available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 63A à 63E (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 63A to 63E available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 available (new INS coordinates, please see NOTAM)

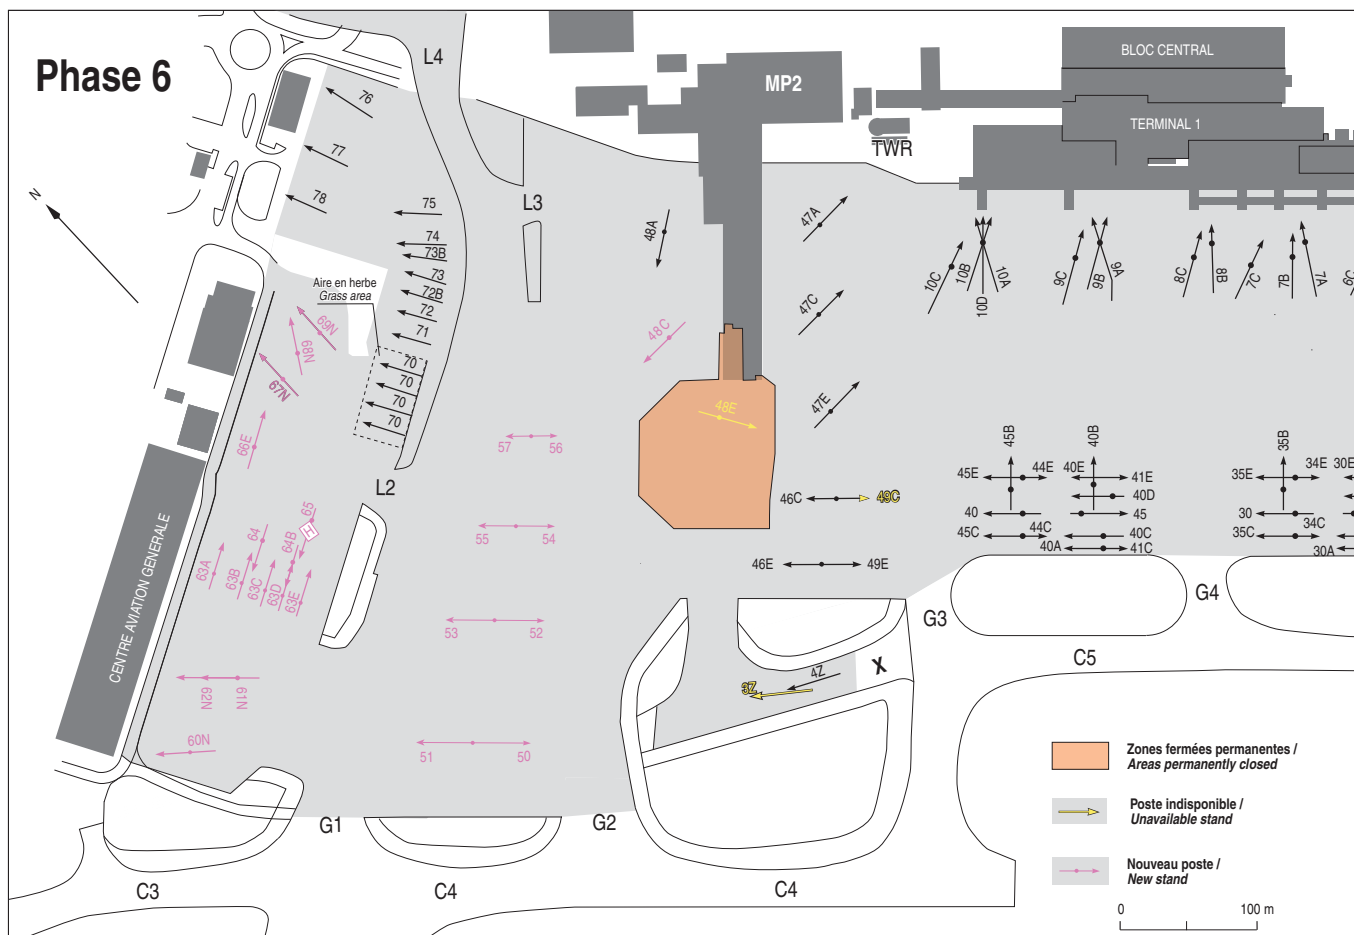


Annexe / Appendix 7 : Phase 7 - Travaux sur postes 46 à 49 / Works on stands 46 to 49

Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :

- Postes 3Z et 4Z / Stands 3Z and 4Z
- Postes 46C, 46E, 47E, 49C et 49E / Stands 46C, 46E, 47E, 49C and 49E

Nouveaux postes de stationnement mis à disposition / New parking stands available :

- Mise à disposition des nouveaux postes 48C et 48E (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 48C and 48E available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 60N, 61N et 62N (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 60N, 61N and 62N available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 64, 64B, 65, 66E, 67N, 68N et 69N (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 64, 64B, 65, 66E, 67N, 68N and 69N available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 63A à 63E (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 63A to 63E available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 available (new INS coordinates, please see NOTAM)

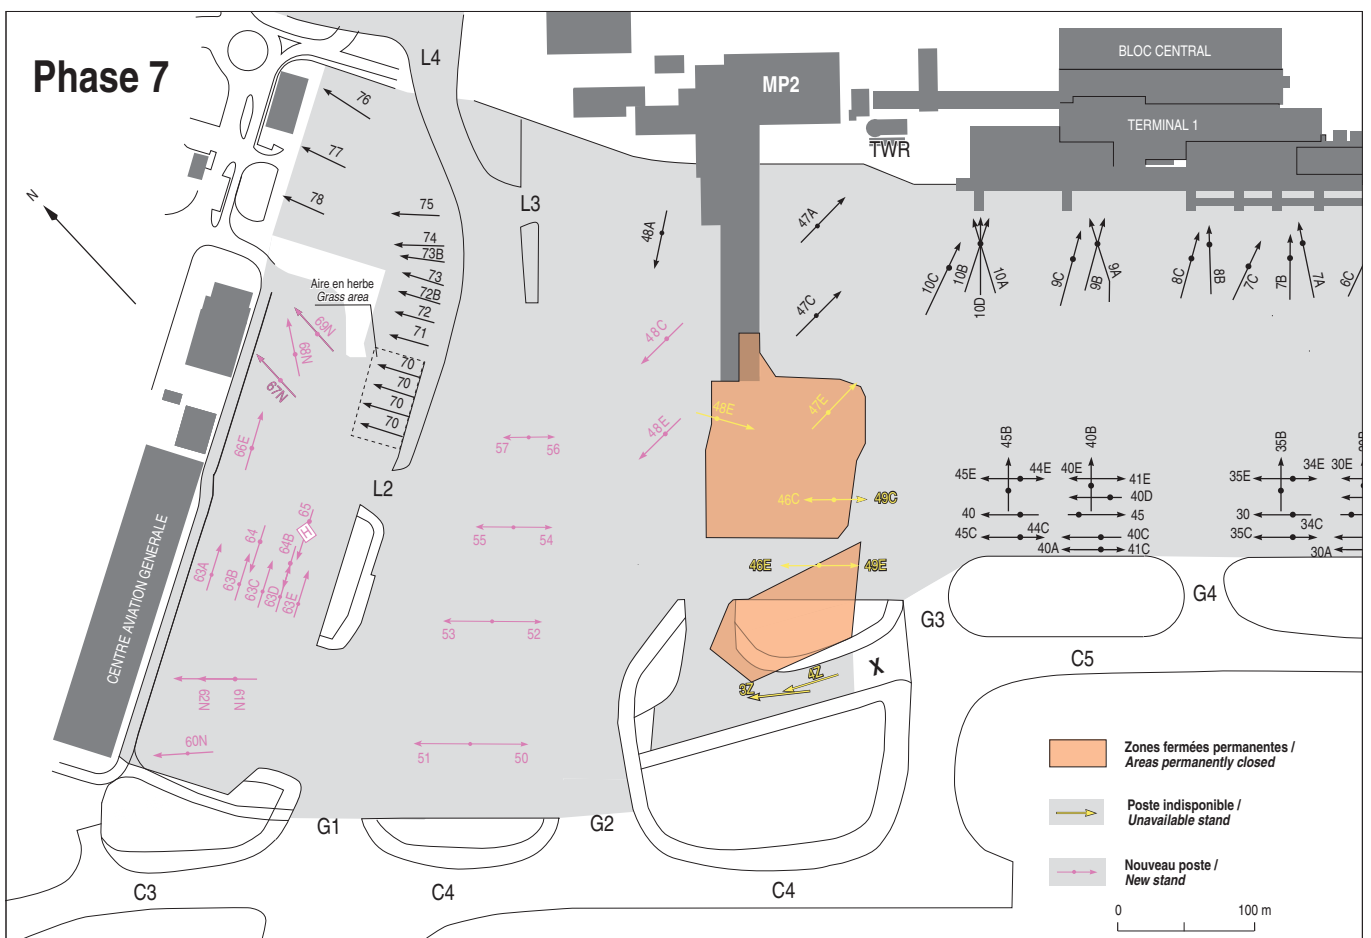


Annexe / Appendix 8 : Phase 8 - Travaux sur postes 47A et 47C / Works on stands 47A and 47C

Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :

- Poste 3Z / Stand 3Z
- Postes 47A et 47C / Stands 47A and 47C
- Postes 46C, 46E, 49C et 49E / Stands 46C, 46E, 49C and 49E

Nouveaux postes de stationnement mis à disposition / New parking stands available :

- Mise à disposition du nouveau poste 48C (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stand 48C available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 47E, 47G, 48E et 48G (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stand 47E, 47G, 48E and 48G available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 60N, 61N et 62N (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 60N, 61N and 62N available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 64, 64B, 65, 66E, 67N, 68N et 69N (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 64, 64B, 65, 66E, 67N, 68N and 69N available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 63A à 63E (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 63A to 63E available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 available (new INS coordinates, please see NOTAM)

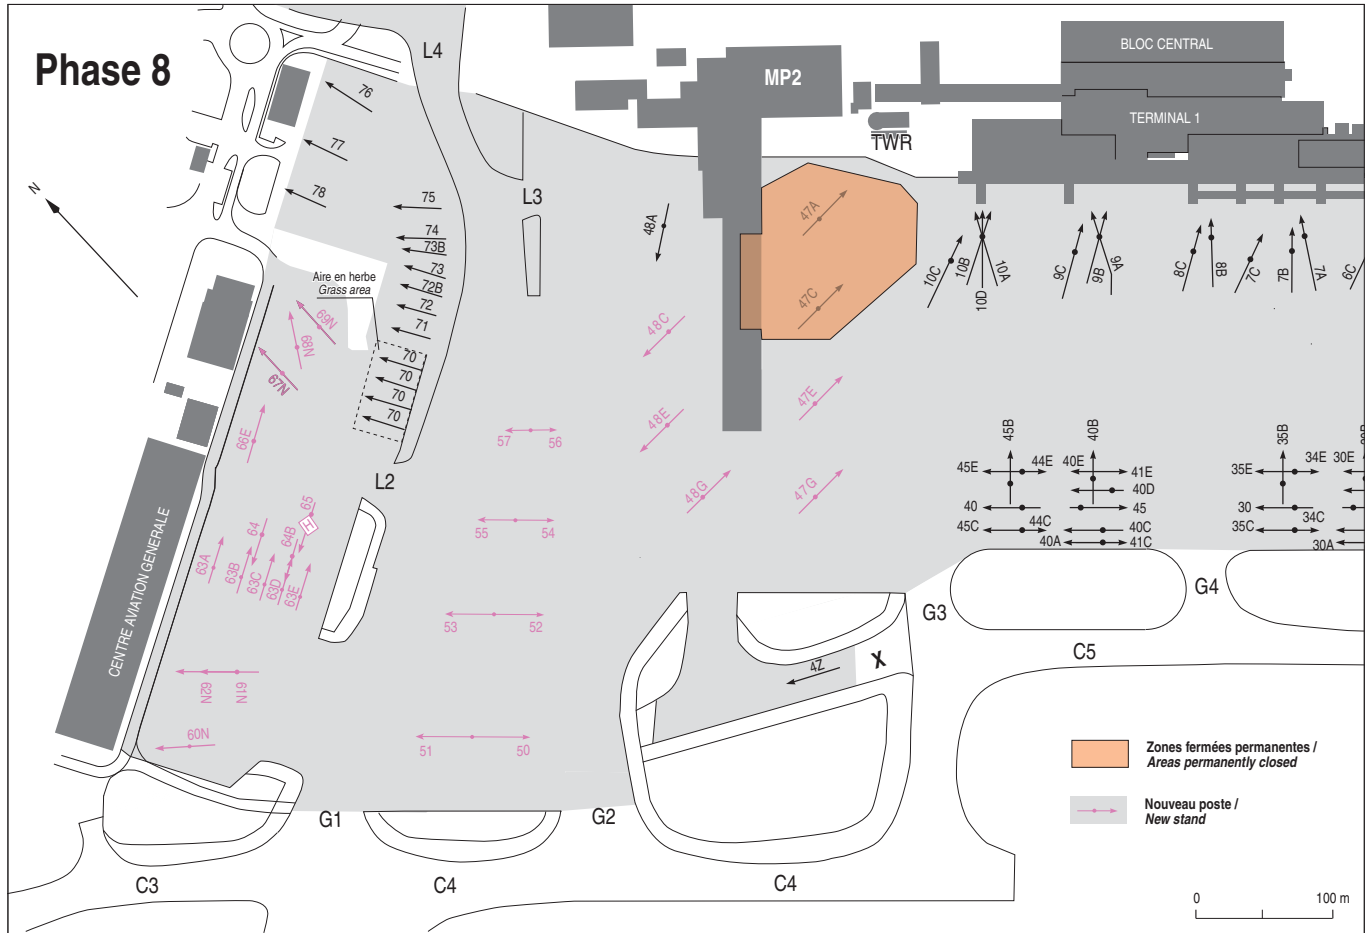


Annexe / Appendix 9 : Phase 9 - Travaux sur postes 48A et 48C / Works on stands 48A and 48C

Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :

- Poste 3Z / Stand 3Z
- Postes 48A et 48C / Stands 48A and 48C
- Postes 46C, 46E, 49C et 49E / Stands 46C, 46E, 49C and 49E

Nouveaux postes de stationnement mis à disposition / New parking stands available :

- Mise à disposition des nouveaux postes 47E, 47G, 48E et 48G (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 47E, 47G, 48E and 48G available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 60N, 61N et 62N (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 60N, 61N and 62N available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 64, 64B, 65, 66E, 67N, 68N et 69N (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 64, 64B, 65, 66E, 67N, 68N and 69N available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 63A à 63E (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 63A to 63E available (new INS coordinates, please see NOTAM)
- Mise à disposition des nouveaux postes 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 (nouvelles coordonnées INS cf. NOTAM) / new stands 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 available (new INS coordinates, please see NOTAM)

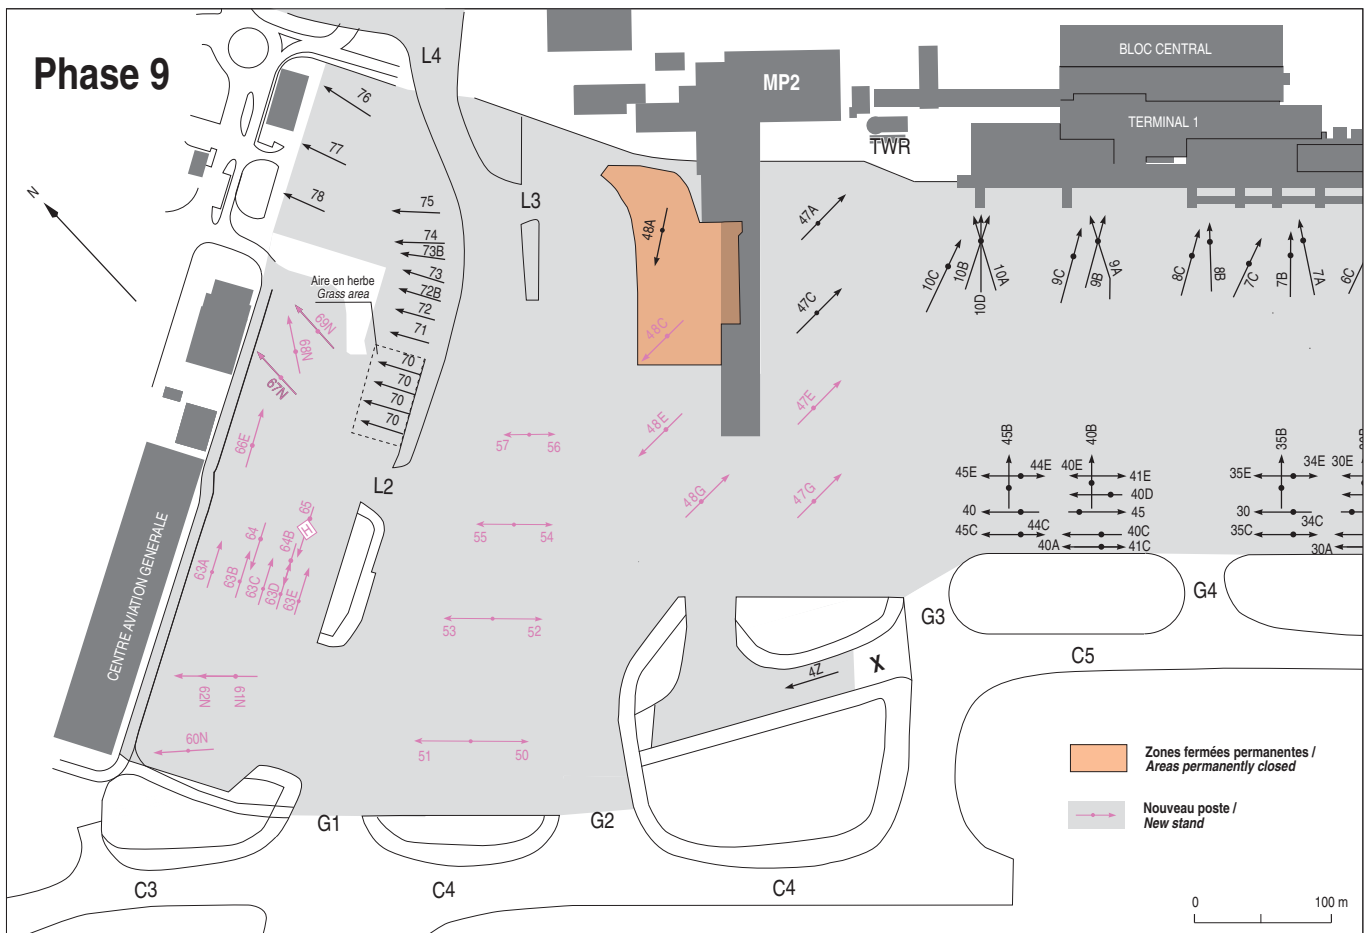

Annexe / Appendix 10 : Phase 10 - Configuration finale / Final configuration

Cette information sera reprise dans l'AIP au cycle 05/19 en vigueur le 25 avril 2019.

